

الابتكار وكفاءة الإنفاق

يتناول هذا الفصل العلاقة بين الابتكار والمال من وجهيها: الابتكار وسيلة لرفع كفاءة الإنفاق، والإنفاق على الابتكار نفسه يحتاج إلى كفاءة. ويعرض كيف تقلل المعرفة المبكرة تكلفة الخطأ، ولماذا تُحسب التكلفة الكلية لا تكلفة الإطلاق، ولماذا تتجاوز المشروعات الكبيرة ميزانياتها، وكيف تُقدَّر الجدوى بأبعاد متعددة، وما التكاليف التي لا تظهر في أي ميزانية.

في هذا الفصل

مدخل

1. وجهان للعلاقة

2. تكلفة التعلم وتكلفة الخطأ

3. التكلفة الكلية لا تكلفة الإطلاق

4. لماذا تتجاوز المشروعات الكبيرة ميزانياتها؟

5. الجدوى متعددة الأبعاد

6. التكاليف التي لا تظهر في الميزانية

أداة الفصل

الخلاصة والأسئلة

مدخل

حالة افتتاحية: مشروعان (حالة مركّبة)

قررت جهة حكومية إعادة بناء إحدى خدماتها الرئيسة رقميًا في مشروع واحد كبير مدته ثلاث سنوات، بعد دراسة جدوى مفصلة وعقد مع شركة كبرى. وفي السنة الثالثة، كان المشروع قد تجاوز ميزانيته بنحو الضعف، وتأخر إطلاقه عامًا، وحين أُطلق اكتشف المستخدمون أن كثيرًا من الخطوات التي بُني عليها تغيرت أنظمتها خلال مدة التنفيذ. وفي

الوقت نفسه، كان فريق صغير في إدارة أخرى قد اختبر خلال ستة أسابيع تعديلاً على خطوة واحدة في خدمة مشابهة، بتكلفة لا تُذكر، فاختصر مدة إنجازها إلى النصف، ثم عممه تدريجيًا على بقية الفروع.

لم يكن الفرق بين المشروعين في الكفاءة الفنية لمن نفذهما، وإنما في طريقة التعامل مع عدم اليقين: فالأول التزم بكل شيء قبل أن يعرف، والثاني تعلّم قبل أن يلتزم. ويتناول هذا الفصل لماذا تكون الطريقة الثانية في الغالب أكفأ إنفاقًا، على الرغم من أن الأولى تبدو أكثر انضباطًا.

أهداف الفصل

يُتوقع من القارئ بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادرًا على:

- ١ التمييز بين الابتكار وسيلةً لكفاءة الإنفاق، وكفاءة الإنفاق على الابتكار.
- ٢ تفسير تزايد تكلفة التغيير مع تقدم المشروع، وقيمة الإنفاق المبكر على التعلم.
- ٣ حساب التكلفة الكلية للحل على امتداد عمره.
- ٤ تفسير تجاوز المشروعات الكبيرة لميزانياتها، وأساليب الحد منه.
- ٥ تقدير جدوى المبادرة بأبعاد متعددة، والتعرف على التكاليف الخفية لضعف إدارة الابتكار.

وجهان للعلاقة I-IV


تتجه الحكومات، ومنها المملكة ضمن رؤية ٢٠٣٠، إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، أي تحقيق قيمة أكبر بالموارد المتاحة (رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، ٢٠١٦). وللابتكار مع هذا التوجه علاقة ذات وجهين.

فالابتكار من جهة وسيلة لكفاءة الإنفاق: فكثير من الابتكارات في القطاع العام تقلل التكلفة، أو تختصر الوقت، أو تمنع الهدر، أو تحقق نتيجة أفضل بالتكلفة نفسها. وقد كان التعديل الذي أجراه الفريق الصغير في الحالة الافتتاحية مثالاً على ذلك. ومن جهة أخرى، الإنفاق على الابتكار نفسه يحتاج إلى كفاءة: فالمراكز والمنصات والمسرعات والمشروعات الكبيرة تستهلك موارد، وقد لا تنتج ما يبرر تكلفتها.

ويجمع هذا الفصل الوجهين في سؤال واحد: كيف تنفق المؤسسة على الابتكار بطريقة تجعل كل ريال يشتري أكبر قدر من التعلم والقيمة؟ ويبني في ذلك على ما عرضه الفصل العاشر من التمويل المرحلي ومنطق الخيارات الحقيقية، والفصل الرابع عشر من التجريب.

٢-١٧ تكلفة التعلم وتكلفة الخطأ

من أقدم الملاحظات في هندسة البرمجيات أن تكلفة تصحيح الخطأ تتزايد كلما تأخر اكتشافه. فقد بين بوهم أن تصحيح خطأ في المتطلبات بعد تشغيل النظام قد يكلف أضعاف تصحيحه في مرحلة تحديد المتطلبات، وقد يبلغ الفرق مئة ضعف في المشروعات الكبيرة (Boehm, 1981). ويصدق المنطق نفسه على الابتكار عامة، كما يوضح الشكل ١-١٧.

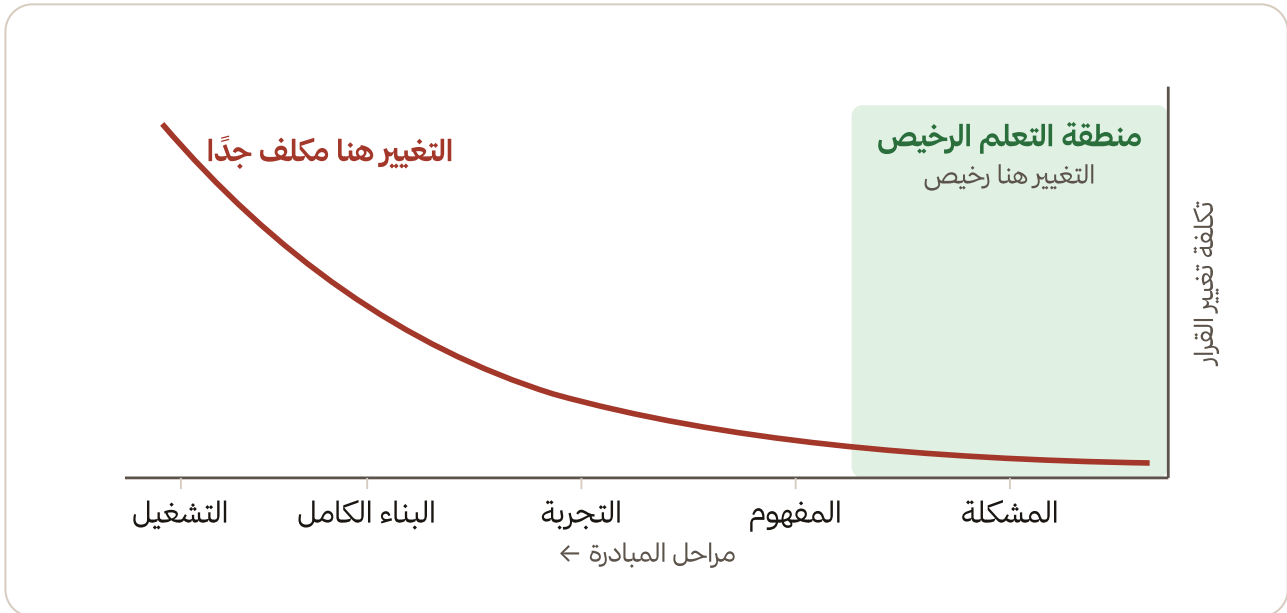

شكل ١-١٧ تزايد تكلفة تغيير القرار مع تقدم المبادرة. إعداد المؤلف، مع الاستفادة من (Boehm (1981). المنحنى توضيحي.

ويستنتج من ذلك مبدأ بسيط: أن الإنفاق المبكر على التعلم هو أرخص إنفاق في الابتكار. فقد درس تومكي وفوجيموتو ما سميته **التقديم المبكر لحل المشكلات** في تطوير السيارات، فوجدوا أن الشركات التي تكتشف المشكلات وتحلها في المراحل الأولى من التطوير، بالمحاكاة والنماذج الأولية، تختصر وقت التطوير وتكلفته مقارنة بالتي تكتشفها متأخرة (Thomke & Fujimoto, 2000).

وفي الحالة الافتتاحية، أنفق أغلب المال بعد الالتزام، حين أصبح كل تغيير مكلفًا. أما الفريق الصغير، فأنفق القليل في منطقة التعلم الرخيص، ثم أنفق على التوسع بعد أن عرف ما ينجح. وهذا معنى فهم المشكلة قبل الحل، واختبار الافتراضات قبل البناء: فهذا أكفأ طرق إنفاق المال.

٣-١٧ التكلفة الكلية لا تكلفة الإطلاق

تقع المؤسسات كثيرًا في خطأ تقييم الحل بتكلفة إطلاقه وحدها: تكلفة البناء أو الشراء أو التأسيس. غير أن هذه التكلفة قد تكون الجزء الأصغر من التكلفة الحقيقية. ويقترح مفهوم **التكلفة الكلية للملكية** أن تُحسب تكلفة الحل على امتداد عمره: الشراء، والتشغيل، والصيانة، والتدريب، والدعم، والتحديث، والتكاليف الداخلية غير المباشرة، ثم تكلفة الإنهاء أو الاستبدال (Ellram, 1995).

ويفسر هذا المفهوم ظاهرة تتكرر في منظومات الابتكار: كيانات أنشئت بميزانيات تأسيسية كبيرة، ثم لم تُحسب تكلفة تشغيلها السنوية، ولا الوقت البشري اللازم لتفعيلها، فبقيت قائمة بلا نشاط. فمعمل فاب لاب في جامعة يكلف، إلى جانب ثمن أجهزته، فنيين يشغلونه، ومواد استهلاكية، وصيانة، وساعات من أعضاء هيئة التدريس لإدماجه في المقررات، وجهدًا مستمرًا لاستقطاب الطلاب إليه. والمؤسسة التي تمويل التأسيس ولا تمويل هذه العناصر تشتري جهازًا لا منظومة. ويتصل ذلك بما عرضه الفصل الثالث عشر عن معادلة الاستدامة في نموذج العمل.

تطبيق مهني

اختر كيانًا أو منصة للابتكار في مؤسستك، واحسب تكلفته الكلية في السنة الأخيرة: الميزانية المعتمدة له، ومعها وقت الموظفين الذين يعملون فيه أو معه، والتراخيص، والمساحات، والصيانة. ثم اقسم المجموع على عدد الحلول التي طُبقت فعليًا بفضلها. قد يغيّر هذا الرقم طريقة نقاشكم عنه.

٤-١٧ لماذا تتجاوز المشروعات الكبيرة ميزانياتها؟

درس فليفيبرغ وزملاؤه قاعدة بيانات تضم أكثر من ستة عشر ألف مشروع كبير في قطاعات ودول مختلفة. فوجدوا أن نحو ثمانية ونصف في المئة منها فقط أُنجزت في حدود ميزانياتها وموعدها، وأن نحو نصف في المئة فقط أُنجزت في حدود الميزانية والموعود وحقت المنافع المتوقعة (Flyvbjerg & Gardner, 2023). وأرجعوا ذلك إلى عوامل متعددة، أبرزها **تحيز التفاؤل** الذي يجعل المخططين يقللون من التكاليف والمخاطر وبيالغون في المنافع، والضغط لإظهار المشروع جذابًا ليُعتمد (Flyvbjerg, 2014).

ويقترح فليفيبرغ وغاردنر عدة مبادئ للحد من ذلك، يتسق أكثرها مع منطق هذا الكتاب:

- **فكر ببطء، ونفذ بسرعة:** أن يُستثمر الوقت في التخطيط والتجريب حين يكون التغيير رخيصًا، ثم يُنفذ بسرعة حين يصبح التأخير مكلفًا. وهذا ما يوضحه الشكل ١٧-١.

- **التنبؤ بالفئة المرجعية:** أن تُقدّر تكلفة المشروع ومدته بالنظر إلى ما حدث فعلياً في مشروعات مشابهة، لا بالنظر إلى تفاصيل المشروع نفسه وحدها، لأن التفاصيل تغري بالتفاؤل.
- **الوحدات الصغيرة المتكررة:** المشروعات التي تُبنى من وحدات صغيرة تتكرر وتتحسن مع كل تكرار أقل عرضة للتجاوز من المشروعات الفريدة الضخمة. ويتسق ذلك مع التوسع المتدرج الذي عرضه الفصل الخامس عشر.
- ولا يعني ذلك أن المشروعات الكبيرة خطأ في ذاتها؛ فبعض الحلول لا يمكن تقسيمها. لكنه يعني أن كل جزء يمكن اختباره صغيراً قبل الالتزام الكبير ينبغي أن يُختبر.

الجدوى متعددة الأبعاد ٥-١٧

تُختزل دراسات الجدوى أحياناً في حساب مالي: التكلفة مقابل العائد. غير أن قرارات الاستثمار العام تحتاج إلى نظرة أوسع. ويقدم دليل الخزانة البريطانية لتقييم الاستثمارات العامة إطاراً من خمس حالات ينبغي أن يجيب عنها أي مقترح استثماري (HM Treasury, 2022). ويعرضها الجدول ١-١٧ مع ما يقابلها في هذا الكتاب.

جدول ١-١٧ الأبعاد الخمسة لتقييم الجدوى، بتصرف عن (HM Treasury 2022)		
البعد	سؤاله	ما يقابله في الكتاب
الاستراتيجي	هل توجد حاجة حقيقية للتدخل؟ وهل يتسق مع الأولويات؟	فهم المشكلة (ف١١)، وساحات البحث (ف٤)
الاقتصادي	هل هذا البديل يحقق أفضل قيمة للمجتمع مقارنة بالبديل الأخرى، ومنها عدم التدخل؟	مقارنة البدائل (ف١٢)، والقيمة العامة (ف١٣)
التجاري	هل يمكن شراء الحل أو تقديمه بشروط مناسبة وشراكات قابلة للتطبيق؟	الموارد والشركاء في نموذج العمل (ف١٣)
المالي	هل التكلفة الكلية ممكنة ومغطاة على امتداد عمر الحل؟	التكلفة الكلية (هذا الفصل)، ومعادلة الاستدامة (ف١٣)
الإداري	هل توجد القدرة والحوكمة اللازمتان للتنفيذ والتشغيل؟	الحوكمة (ف١٠)، والملكية والتوسع (ف١٥)

ويضيف منطق هذا الكتاب إلى هذه الأبعاد بعدًا سادسًا كثيرًا ما يُغفل: **البعد الإنساني**. هل يوجد من يملك الدافعية والقدرة على العمل على هذه المبادرة؟ وهل سيقبلها من سيستخدمونها ويشغلونها؟ فالمبادرة الجيدة اقتصاديًا التي لا يتبناها أحد تفشل كما تفشل المبادرة الضعيفة اقتصاديًا، وقد عرض الفصل الخامس عشر لماذا.

ولا يعني تعدد الأبعاد أن تُطلب دراسة مفصلة لكل بعد في كل مرحلة. فكما بين الفصل العاشر، تتدرج المعايير من الافتراضات إلى الأدلة، وتتدرج دراسة الجدوى معها: أسئلة مختصرة في بداية المبادرة، ودراسة أعمق قبل الالتزام بالتوسع.

٦-١٧ التكاليف التي لا تظهر في الميزانية

تحسب المؤسسات ما تنفقه، ونادرًا ما تحسب ما تخسره. وفي إدارة الابتكار، توجد تكاليف كبيرة لا تظهر في أي ميزانية، يوضحها الشكل ٦-١٧.

ما يظهر في الميزانية

- تأسيس المراكز والمعامل والمنصات
- العقود والتراخيص
- الفعاليات والمسابقات والجوائز

خط الميزانية

ما لا يظهر فيها

- **تكلفة الاقترار:** وقت الفرق المنتظرة، والأفكار التي تقادمت قبل أن يُبت فيها
- **تكلفة الازدواج:** جهات تنفذ مبادرات متشابهة دون أن تعرف إحداها عن الأخرى
- **تكلفة الاستمرار فيما يجب إيقافه:** موارد تُستهلك في مبادرات لا تدعمها الأدلة
- **تكلفة الفرصة الضائعة:** مشكلات لم تُحل، وتحسينات لم تحدث
- **تكلفة المبتكرين المفقودين:** أشخاص توقفوا عن المحاولة، أو غادروا إلى حيث تُقدَّر أفكارهم

شكل ٦-١٧ التكاليف الظاهرة والخفية في إدارة الابتكار. إعداد المؤلف.

وأثقل هذه التكاليف آخرها، وأصعبها حسابًا. فقد عرض الفصل السابع ما رواه أحد المبتكرين الناجحين عن صديق موهوب اضطر إلى وظيفة بعيدة عن شغفه فانطفأ اهتمامه بمشروعه (Alsamani, 2023). وكل مؤسسة فيها من توقف عن تقديم أفكاره لأنه تعلم أنها لا تُسمع. وهذه هي الأطروحة التي يقوم عليها هذا الكتاب في صورتها المالية؛ فالمنظومة التي تنفق على المدخلات الظاهرة وتُهمل الإنسان تدفع ثمنًا مضاعفًا: ثمن ما أنشأته، وثمن ما خسرتَه من قدرة الناس ورغبتهم في الابتكار.

مبدأ

أكفأ إنفاق على الابتكار هو الإنفاق المبكر على التعلم، والإنفاق المستمر على الإنسان. وأقل الإنفاق كفاءة هو تأسيس كيانات كبيرة قبل أن يُعرف من سيستخدمها، وكيف ستعمل، ومن سيتحمل تكلفتها.

أداة الفصل: ورقة القيمة والتكلفة الكلية

املاً هذه الورقة لأي مبادرة أو كيان يُقترح إنشاؤه أو التوسع فيه. واحرص على أن تُحسب التكلفة على امتداد خمس سنوات على الأقل، وأن تُقارن ببديلين: بديل أصغر، وبديل عدم التدخل.

أداة الفصل ورقة القيمة والتكلفة الكلية		
البند	السؤال	الإجابة
الحاجة	ما المشكلة التي يعالجها؟ وما الدليل عليها؟	
تكلفة الإطلاق	البناء أو الشراء أو التأسيس	
تكلفة التشغيل السنوية	الأشخاص، والصيانة، والتراخيص، والمواد، والمساحات	
التكلفة البشرية الداخلية	وقت الموظفين أو الأساتذة اللازم لتفعيله	
التكلفة الكلية لخمس سنوات	مجموع ما سبق	
القيمة المتوقعة	ما الذي سيتحسن؟ وكيف سيُقاس؟ (الفصل ١٦)	
التقدير بالفئة المرجعية	ماذا حدث في مبادرات مشابهة هنا أو في جهات أخرى؟	

البند	السؤال	الإجابة
البديل الأصغر	ما أصغر نسخة يمكن أن تختبر القيمة أولاً؟ وكم تكلف؟	
بديل عدم التدخل	ماذا يحدث إن لم نفعل شيئاً؟	
البعد الإنساني	من سيعمل عليه؟ ومن سيستخدمه؟ وهل يريدونه؟	
المالك ومصدر التمويل الدائم	من يتحمل التكلفة بعد السنة الأولى؟	

خلاصة الفصل

- للعلاقة بين الابتكار والمال وجهان: الابتكار وسيلة لكفاءة الإنفاق، والإنفاق على الابتكار يحتاج إلى كفاءة.
- تتزايد تكلفة التغيير مع تقدم المبادرة، ولذلك يكون الإنفاق المبكر على التعلم أرخص إنفاق في الابتكار.
- تُقَيِّم الحلول بتكلفتها الكلية على امتداد عمرها. وتمويل التأسيس دون التشغيل يوفر جهازاً دون أن يبني منظومة.
- تتجاوز أغلب المشروعات الكبيرة ميزانياتها لعوامل أبرزها تحيز التفاؤل، ويحد من ذلك التنبؤ بالفئة المرجعية، والوحدات الصغيرة المتكررة، والتفكير البطيء قبل التنفيذ السريع.
- تُقَيِّم الجدوى بأبعاد خمسة: الاستراتيجي، والاقتصادي، والتجاري، والمالي، والإداري، ويضيف الكتاب إليها البعد الإنساني.
- من أثقل تكاليف الابتكار ما لا يظهر في الميزانية: اللاقرار، والازدواج، والاستمرار فيما يجب إيقافه، والمبتكرون المفقودون.

مصطلحات الفصل

كفاءة الإنفاق Spending efficiency	تحقيق أكبر قيمة ممكنة بالموارد المتاحة.
--------------------------------------	---

التقديم المبكر لحل المشكلات	Front-loading	اكتشاف المشكلات وحلها في المراحل الأولى، حين يكون التغيير أرخص.
التكلفة الكلية للملكية	Total cost of ownership	تكلفة الحل على امتداد عمره، من الشراء إلى التشغيل إلى الإنهاء.
تحيز التفاؤل	Optimism bias	الميل إلى التقليل من التكاليف والمخاطر والمبالغة في المنافع عند التخطيط.
التنبؤ بالفئة المرجعية	Reference class forecasting	تقدير التكلفة والمدة بالنظر إلى ما حدث فعلاً في مشروعات مشابهة.

أسئلة للمراجعة والمناقشة

- ١ لماذا يُعد الإنفاق المبكر على التعلم أكفأ إنفاق في الابتكار؟ **فهم**
- ٢ احسب التكلفة الكلية لكيان ابتكاري في مؤسستك، وقارنها بميزانيته المعتمدة. **تطبيق**
- ٣ حلل المشروعين في الحالة الافتتاحية بمفاهيم الفصل: تكلفة التغيير، وتحيز التفاؤل، والوحدات الصغيرة. **تحليل**
- ٤ طبق الأبعاد الخمسة والبعد الإنساني على مبادرة مقترحة في مؤسستك. **تطبيق**
- ٥ «الإنفاق على الابتكار ترف في أوقات ترشيد الإنفاق». قوّم هذه العبارة. **تقويم**

